# Project-plan-v1.0 FlyBy



## Μέλη ομάδας :

Επώνυμο	Όνομα	AM	Έτος
Ζερβού	Πουλχερία	1067511	40
Πανδής	Αναστάσιος	1056287	50
Πορτοκάλογλου	Ανδρονίκη	1067539	40
Ράπτης	Νικόλαος Μάριος	1047170	70

Writer: Ζερβού Πουλχερία

Reviewer: Πορτοκάλογλου Ανδρονίκη, Πανδής Αναστάσιος, Ράπτης Νικόλαος

Μάριος

## Χρονοπρογραμματισμός Έργου

### Τα υποέργα του project:

ΤΥ1: Ανάλυση απαιτήσεων

ΤΥ2: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

ΤΥ3: Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος

ΤΥ4: Υπολογισμός κόστους ΤΥ5: Εύρεση επενδυτών

ΤΥ6: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

ΤΥ7: Έρευνα και εκπαίδευση σχετική με τη δομή και τη λειτουργία των drones

TY8: Ανάπτυξη Back End TY9: Ανάπτυξη Front End

TY10: Ανάπτυξη User Interface

ΤΥ11: Διασύνδεση Βάσης Δεδομένων με τη πλατφόρμα

ΤΥ12: Ολοκλήρωση και έλεγχος

ΤΥ13: Δημιουργία mobile έκδοσης της πλατφόρμας

ΤΥ14: Προώθηση της πλατφόρμας (marketing)

Milestone 1: Ολοκλήρωση πρώτη φάσης και σχεδιασμού.

Milestone 2: Ολοκλήρωση ανάπτυξης.


Milestone 3: Ολοκλήρωση υλοποίησης mobile έκδοσης και ολοκλήρωση

του έργου.

#### **Gantt chart:**



#### Pert chart:

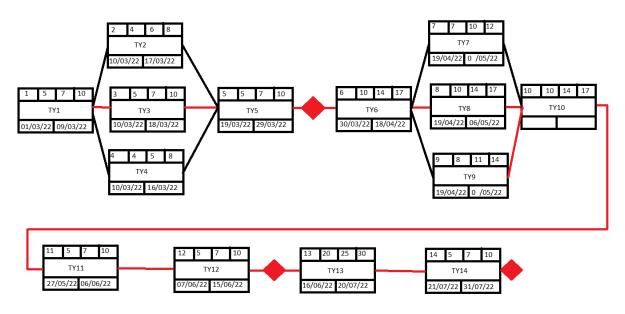

Με κόκκινο μονοπάτι συμβολίζεται το κρίσιμο μονοπάτι (TY1-TY3-TY5-TY6-TY8-TY10-TY11-TY12-TY13-TY14) το οποίο έχει διάρκεια 109 μέρες αθροίζοντας την διάρκεια των υποέργων. Για να κάνουμε ομαλή ανάθεση των υποέργων στο διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και σωστό υπολογισμό του αναμενόμενου κόστους, θα πρέπει να γίνει ανάλογος διαμοιρασμός ευθυνών στα μέλη της ομάδας μας. Έτσι θα έχουμε:

- 1) Ζερβού Πουλχερία: Project manager και Lead Engineer (TY4, TY5, TY7, TY12, TY14).
- 2) Πορτοκάλογλου Ανδρονίκη: Quality manager και Back-end Engineer και Database manager (TY1, TY2, TY6, TY8, TY11, TY12).
- 3) Πανδής Αναστάσιος: Front-End Engineer και User Interface Designer (TY3, TY9, TY10)
- 4) Ράπτης Νικόλαος Μάριος: Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό (ΤΥ7,ΤΥ13)

Έτσι προκύπτει το διάγραμμα:

## Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό:

	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος
	1 9 10 16 17 18 29 30		2 3 6 7 26 27	67 15 16	20 21 31
Ζερβού Πουλχερία	TY4 TY5	ТҮ7		TY12	TY14
Πορτοκάλογλου Ανδρονίκη	TY1 TY2	TY6 TY8	TY11	TY12	
Πανδής Αναστάσιος	ТҮЗ	тү 9	TY10		
Ράπτης Νικόλαος Μάριος		ТҮ7		TY13	

# Εκτίμηση κόστους: 75.376€

Υπολογίζοντας τη διάρκεια των υποέργων για το κάθε μέλος της ομάδας και θεωρώντας ημερήσιο μισθό ίσο με 72€ έχουμε:

Ζερβού Πουλχερία: 36 ημέρες επομένως 2.592€

Πανδής Αναστάσιος: 32 ημέρες επομένως 2.304€

Πορτοκάλογλου Ανδρονίκη: 55 ημέρες επομένως 3.960€

Ράπτης Νικόλαος Μάριος: 35 ημέρες επομένως 2.520€

Άρα το συνολικό κόστος των μισθών είναι: 11.376€

# Έμμεσα κόστη:

Utilities-γραφειο ενοικιο: 6.000 €

Noμικο Outsourcing: 5.000 €

Ερευνα και εκπαιδευση:2.000 €

Εργαλεία :1.000 €

Marketing: 50.000 €
